CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAT
DAT GROUP JOINT STOCK COMPANY

	Thông tin tài liệu
Mã số tài liệu	
Tên tài liệu	HƯỚNG DẪN KIỂM SOÁT TÀI LIỆU DỰ ÁN
Loại tài liệu	Quy trình (SOP - Standard Operating Procedure)
Ngày ban hành đầu tiên	04/2025
Ngày chỉnh sửa cuối cùng	09/2026

Phê duyệt tài liệu

	Họ và tên	Ký tên	Ngày
Soạn thảo	Nguyễn Đức Thắng		04/2025
Cập nhật	Nguyễn Đức Thắng		09/2026
Xem xét			
Phê duyệt			

Lịch sử tài liệu

Phiên bản	Ngày ban hành	Mục thay đổi	Nội dung thay đổi
01	04/2025	Soạn thảo lần đầu	Nguyễn Đức Thắng
02	09/2026	Sửa đổi bổ sung	Nguyễn Đức Thắng

DAT Gia tăng hiệu quả



Quy trình (SOP - Standard Operating Procedure)

CÔNG TÁC:

KIỂM SOÁT TÀI LIỆU DỰ ÁN

DỰ ÁN ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

PHÁT HÀNH NĂM 2025

1. MỤC ĐÍCH

Hướng dẫn này chuẩn hóa cách tổ chức, đặt tên, cập nhật, kiểm soát và tra cứu tài liệu của dự án đảm bảo tính nhất quán, khoa học, dễ dàng tra cứu và truy xuất khi cần thiết.


Mục tiêu chính:

- Tài liệu được lưu đúng vị trí và đúng nhóm hồ sơ.
- Có thể tìm kiếm nhanh theo tên file, thư mục, loại tài liệu hoặc đường dẫn.
- Kiểm soát phiên bản và tránh sử dụng nhầm hồ sơ cũ.
- Phục vụ kiểm soát hồ sơ EPC, nghiệm thu, hoàn công, vận hành và bàn giao.

2. NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ

1. Một tài liệu chỉ có một vị trí lưu trữ chính thức. Không tạo nhiều bản sao trong các thư mục khác nhau nếu không có yêu cầu.
2. Không tự ý thay đổi tên hoặc mã của thư mục cấp 1 và cấp 2 đã được chuẩn hóa.
3. Tài liệu phải được phân loại trước khi lưu: pháp lý, thiết kế, kế hoạch, quản lý dự án, HSE/ES, chất lượng, O&M, commissioning, form hoặc tài liệu khác.
4. Tài liệu có sửa đổi phải thể hiện phiên bản; bản đã được phê duyệt/ban hành phải được nhận diện rõ.
5. Tên file phải đủ thông tin để nhận biết ngày, dự án, nhóm/mã tài liệu, nội dung và phiên bản.
6. Excel "Danh sách tài liệu" là công cụ tra cứu/đăng ký; thư mục dự án là nơi lưu trữ tài liệu gốc.

3. CẤU TRÚC THƯ MỤC CHUẨN

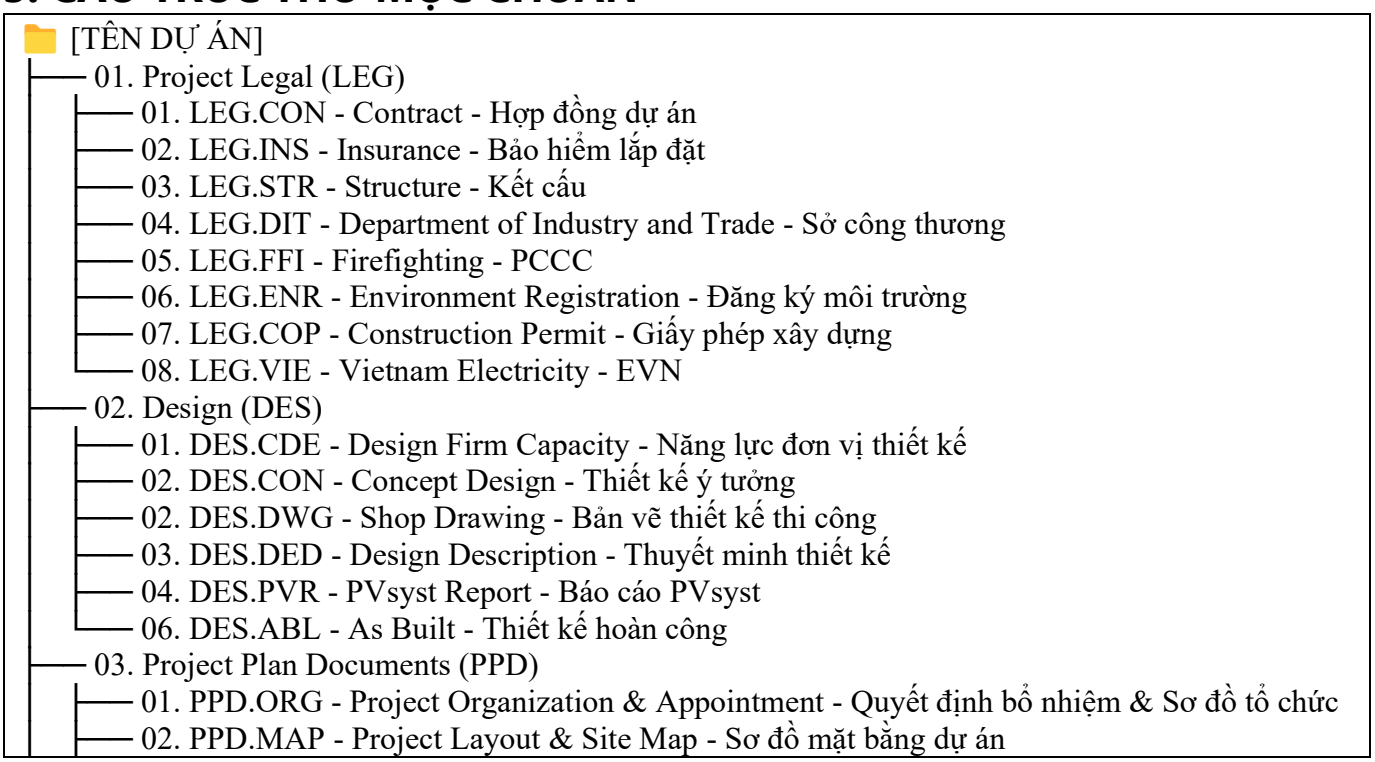

- 03. PPD.CLM - Contact List Matrix - Ma trận liên lạc
- 04. PPD.KOM - Kick-off Meeting - Khởi động dự án
- 05. PPD.SCH - Project Schedule - Tiến độ thi công
- 06. PPD.RES - Resource Plan - Kế hoạch nguồn lực
- 07. PPD.RAM - Risk Assessment & Management - Đánh giá & Quản lý rủi ro
- 08. PPD.BOM - Bill of Materials (BOM) - Định mức & Danh mục vật tư
- 09. PPD.MAS - Material Approval Submission - Trình duyệt vật tư
- 10. PPD.MOS - Method Statement - Biện pháp thi công
- 11. PPD.ITP - Inspection and Test Plan - Kế hoạch kiểm tra & thử nghiệm (ITP)

- 04. Project Management Controls (PMC)
  - 03. PMC.HOM - Handover Minutes - Bàn giao
  - 04. PMC.CSU - Change Summary - Tổng hợp thay đổi
  - 05. PMC.QAC - Risk & Nonconformity - Rủi ro & không phù hợp
  - 06. PMC.SCD - Schedule Control - Kiểm soát tiến độ
  - 07. PMC.MTG - Meetings & Discussions - Họp & trao đổi
  - 08. PMC.REP - Reports - Báo cáo
  - 09. PMC.PPH - Project Photos - Hình ảnh dự án
- 05. Environmental & Social (ENS)
  - 01. ENS.MAD - Manpower Documents - Hồ sơ nhân sự
  - 02. ENS.TRR - Training Records - Hồ sơ đào tạo
  - 03. ENS.TTR - Toolbox Talk Records - Sinh hoạt an toàn
  - 04. ENS.INR - Inspection Records - Hồ sơ kiểm tra
- 06. Quality Documents (QUD)
  - 01. QUD.MAT - Materials - Hồ sơ chất lượng vật tư
  - 02. QUD.WOA - Works - Hồ sơ chất lượng công việc
- 07. Operation and Maintenance Documents (OMD)
  - 01. OMD.GEN - General Information - Thông tin chung hệ thống
  - 02. OMD.SOP - Standard Operating Procedures - Quy trình vận hành chuẩn
  - 03. OMD.SMP - System Monitoring Protocol - Hướng dẫn giám sát hệ thống
  - 04. OMD.PMM - Preventive Maintenance Manual - Hướng dẫn bảo trì phòng ngừa
  - 05. OMD.TRB - Troubleshooting Guide - Xử lý sự cố và lỗi thường gặp
  - 06. OMD.EAP - Emergency Action Plan - Quy trình ứng phó sự cố khẩn cấp
  - 07. OMD.VEN - Vendor Manuals and Catalogs - Tài liệu vận hành nhà sản xuất
  - 08. OMD.SPL - Spare Parts and Tools List - Danh mục vật tư dự phòng và dụng cụ
  - 09. OMD.TRN - Training and Handover - Tài liệu đào tạo và bàn giao
- 08. Commissioning (COM)
  - 01. COM.PRC - Pre-Commissioning - Hồ sơ trước khi vận hành
  - 02. COM.COM - Commissioning - Hồ sơ vận hành
- 09. Handover & Close-out (HCO)
  - 01. HCO.HND - Handover - Bàn giao
  - 02. HCO.ASB - As-built - Hoàn công
  - 03. HCO.PUL - Punch List - Danh sách tồn đọng
- 10. Form (FRM)
  - 01. FRM.TMP - Templates & Forms - Biểu mẫu chuẩn

```
├── 11. Project Working & Temporary (PWT)
│   ├── 01. PWT.DRF - Draft - Bản nháp
│   ├── 02. PWT.WRK - Working - Hồ sơ làm việc
│   └── 03. PWT.TMP - Temporary - Tài liệu tạm
└── 12. Payment documents (PAY)
    ├── 01. PAY.OWN - Owner
    └── 02. PAY.SUB - Subcontractor
```

Cấu trúc thư mục chuẩn gồm 12 nhóm chính, trong thư mục gốc [Tên dự án] gồm các nhóm từ 01 đến 11. Đây là cấu trúc thực tế cần dùng làm cơ sở quản lý. Không tự ý tạo thêm thư mục ở cấp 1 và cấp 2.

Thư mục cấp 1	**Mục đích**
01. Project Legal (LEG)	Hồ sơ pháp lý, hợp đồng dự án, PCCC, Điện lực, Sở Công Thương
02. Design (DES)	Thiết kế, bản vẽ, thuyết minh, PVsyst và hồ sơ liên quan
03. Project Plan Documents (PPD)	Tiến độ, sơ đồ tổ chức, biện pháp, trình duyệt vật tư, ITP, BOM
04. Project Management Controls (PMC)	Quản lý dự án, báo cáo, họp, thay đổi, rủi ro, hình ảnh
05. Environmental & Social (ENS)	Nhân sự, đào tạo, toolbox, kiểm tra, môi trường
06. Quality Documents (QUD)	Hồ sơ chất lượng vật tư và công việc
07. Operation and Maintenance Documents (OMD)	Hồ sơ vận hành và bảo trì (Quy trình, tài liệu nhà thầu, hướng dẫn sự cố)
08. Commissioning (COM)	Pre-commissioning, commissioning
09. Handover & Close-out (HCO)	Hồ sơ hoàn thành, bàn giao, hoàn công (As-built), punch list
10. Form (FRM)	Biểu mẫu chuẩn dùng để lập hồ sơ; quản lý template
11. Project Working & Temporary (PWT)	Hồ sơ làm việc tạm thời: file draft, working; không phải kho chính thức
12. Payment documents (PAY)	Hồ sơ thanh toán (Chủ đầu tư, Nhà thầu phụ)

4. CẤU TRÚC CẤP 2 VÀ MÃ TÀI LIỆU

Các thư mục nghiệp vụ cấp 2 sử dụng mã trong ngoặc để liên kết giữa vị trí lưu trữ và hồ sơ. Đối với nhóm 01 Project Legal, bổ sung mã LEG.CON cho hồ sơ Hợp đồng dự án. Nhóm hợp đồng bao gồm hợp đồng EPC/tổng thầu, phụ lục hợp đồng, PO/đơn đặt hàng liên quan theo phạm vi

quản lý, thư từ quản trị hợp đồng, bảo lãnh, bảo hiểm theo yêu cầu hợp đồng và các tài liệu điều chỉnh hợp đồng. Các hồ sơ kỹ thuật/chất lượng thuần túy vẫn phải lưu ở nhóm DES/PPD/QUD tương ứng….

Nhóm mã	Ý nghĩa
LEG	Pháp lý
DES	Thiết kế
PPD	Kế hoạch dự án
PMC	Quản lý dự án
ENS	Môi trường & xã hội/HSE
QUD	Chất lượng
OMD	Vận hành & bảo trì
COM	Commissioning
HCO	Hồ sơ hoàn công
PWT	Hồ sơ tạm
PAY	Hồ sơ thanh toán

Bảng tra cứu mã tài liệu cấp 2:

Nhóm mã	Mã	Tên tiếng Anh	Tên tiếng Việt
01. Project Legal (LEG)	01. LEG.CON	Contract	Hợp đồng dự án
01. Project Legal (LEG)	02. LEG.INS	Insurance	Bảo hiểm lắp đặt
01. Project Legal (LEG)	03. LEG.STR	Structure	Kết cấu
01. Project Legal (LEG)	04. LEG.ENR	Environment Registration	Đăng ký môi trường
01. Project Legal (LEG)	05. LEG.FFI	Firefighting	PCCC
01. Project Legal (LEG)	06. LEG.VIE	Vietnam Electricity	Điện lực
01. Project Legal (LEG)	07. LEG.COP	Construction Permit	Giấy phép xây dựng
01. Project Legal (LEG)	08. LEG.DIT	Department of Industry and Trade	Sở công thương
02. Design (DES)	01. DES.CDE	Design Firm Capacity	Năng lực đơn vị thiết kế
02. Design (DES)	02. DES.CON	Concept Design	Thiết kế ý tưởng
02. Design (DES)	02. DES.DWG	Shop Drawing	Bản vẽ thiết kế thi công
02. Design (DES)	03. DES.DED	Design Description	Thuyết minh thiết kế
02. Design (DES)	04. DES.PVR	PVsyst Report	Báo cáo PVsyst
02. Design (DES)	06. DES.ABL	As Built	Thiết kế hoàn công
03. Project Plan Documents (PPD)	01. PPD.ORG	Project Organization & Appt.	Quyết định bổ nhiệm & Sơ đồ tổ chức
03. Project Plan Documents (PPD)	02. PPD.MAP	Project Layout & Site Map	Sơ đồ mặt bằng dự án
03. Project Plan Documents (PPD)	03. PPD.CLM	Contact List Matrix	Ma trận liên lạc
03. Project Plan Documents (PPD)	04. PPD.KOM	Kick-off Meeting	Khởi động dự án
03. Project Plan Documents (PPD)	05. PPD.SCH	Project Schedule	Tiến độ thi công
03. Project Plan Documents (PPD)	06. PPD.RES	Resource Plan	Kế hoạch nguồn lực
03. Project Plan Documents (PPD)	07. PPD.RAM	Risk Assessment & Mgt	Đánh giá & Quản lý rủi ro
03. Project Plan Documents (PPD)	08. PPD.BOM	Bill of Materials (BOM)	Định mức & Danh mục vật tư
03. Project Plan Documents (PPD)	09. PPD.MAS	Material Approval Submission	Trình duyệt vật tư
03. Project Plan Documents (PPD)	10. PPD.MOS	Method Statement	Biện pháp thi công
03. Project Plan Documents (PPD)	11. PPD.ITP	Inspection and Test Plan	Kế hoạch kiểm tra (ITP)

04. Project Management Controls (PMC)	03. PMC.HOM	Handover Minutes	Bàn giao
04. Project Management Controls (PMC)	04. PMC.CSU	Change Summary	Tổng hợp thay đổi
04. Project Management Controls (PMC)	05. PMC.QAC	Risk & Nonconformity	Rủi ro & không phù hợp
04. Project Management Controls (PMC)	06. PMC.SCD	Schedule Control	Kiểm soát tiến độ
04. Project Management Controls (PMC)	07. PMC.MTG	Meetings & Discussions	Họp & trao đổi
04. Project Management Controls (PMC)	08. PMC.REP	Reports	Báo cáo
04. Project Management Controls (PMC)	09. PMC.PPH	Project Photos	Hình ảnh dự án
05. Environmental & Social (ENS)	01. ENS.MAD	Manpower Documents	Hồ sơ nhân sự
05. Environmental & Social (ENS)	02. ENS.TRR	Training Records	Hồ sơ đào tạo
05. Environmental & Social (ENS)	03. ENS.TTR	Toolbox Talk Records	Sinh hoạt an toàn
05. Environmental & Social (ENS)	04. ENS.INR	Inspection Records	Hồ sơ kiểm tra
06. Quality Documents (QUD)	01. QUD.MAT	Materials	Hồ sơ chất lượng vật tư
06. Quality Documents (QUD)	02. QUD.WOA	Works	Hồ sơ chất lượng công việc
07. Operation and Maintenance (OMD)	01. OMD.GEN	General Information	Thông tin chung hệ thống
07. Operation and Maintenance (OMD)	02. OMD.SOP	Standard Operating Procedures	Quy trình vận hành chuẩn
07. Operation and Maintenance (OMD)	03. OMD.SMP	System Monitoring Protocol	Hướng dẫn giám sát hệ thống
07. Operation and Maintenance (OMD)	04. OMD.PMM	Preventive Maintenance Manual	Hướng dẫn bảo trì phòng ngừa

07. Operation and Maintenance (OMD)	05. OMD.TRB	Troubleshooting Guide	Xử lý sự cố và lỗi thường gặp
07. Operation and Maintenance (OMD)	06. OMD.EAP	Emergency Action Plan	Quy trình ứng phó sự cố khẩn cấp
07. Operation and Maintenance (OMD)	07. OMD.VEN	Vendor Manuals and Catalogs	Tài liệu vận hành nhà sản xuất
07. Operation and Maintenance (OMD)	08. OMD.SPL	Spare Parts and Tools List	Danh mục vật tư dự phòng
07. Operation and Maintenance (OMD)	09. OMD.TRN	Training and Handover	Tài liệu đào tạo và bàn giao
08. Commissioning (COM)	01. COM.PRC	Pre-Commissioning	Hồ sơ trước khi vận hành
08. Commissioning (COM)	02. COM.COM	Commissioning	Hồ sơ vận hành
09. Handover & Close-out (HCO)	01. HCO.HND	Handover	Bàn giao
09. Handover & Close-out (HCO)	02. HCO.ASB	As-built	Hoàn công
09. Handover & Close-out (HCO)	03. HCO.PUL	Punch List	Danh sách tồn đọng
10. Form (FRM)	01. FRM.TMP	Templates & Forms	Biểu mẫu chuẩn
11. Project Working & Temp. (PWT)	01. PWT.DRF	Draft	Bản nháp
11. Project Working & Temp. (PWT)	02. PWT.WRK	Working	Hồ sơ làm việc
11. Project Working & Temp. (PWT)	03. PWT.TMP	Temporary	Tài liệu tạm
12. Payment documents (PAY)	01. PAY.OWN	Owner	Thanh toán Chủ đầu tư
12. Payment documents (PAY)	02. PAY.SUB	Subcontractor	Thanh toán Nhà thầu phụ

5. QUY TẮC ĐẶT TÊN FILE

Công thức: YYYYMMDD_[ProjectCode]_[DocumentCode]_[TenTaiLieu]_[vX]

Thành phần	Quy tắc	Ví dụ
YYYYMMDD	Ngày phát hành/ban hành tài liệu	20260929
ProjectCode	Mã viết tắt thống nhất của dự án	FMS-RVA270
DocumentCode	Mã thư mục chứa tài liệu	PPD.MOS
TenTaiLieu	Ngắn gọn, không dấu, dễ đọc	BPTCLapDatTamPin
vX	v1, v2, v3... khi sửa đổi	v2

Ví dụ: 20260929_FMS-RVA270_PPD.MOS_BPTCLapDatTamPin_v2.pdf

Tên file phải tránh ký tự đặc biệt không cần thiết; không dùng tên chung chung như "finalfinal", "new", "moi", "ban moi" để thay cho số phiên bản.

6. QUẢN LÝ PHIÊN BẢN

- Bản phát hành đầu tiên: v1.
- Mỗi lần sửa đổi nội dung có kiểm soát: tăng v2, v3, v4...
- *Nếu tài liệu được xác định là bản cuối cùng, có thể thêm _Final sau số phiên bản.*
- Không ghi đè bản đã phát hành nếu dự án yêu cầu lưu vết thay đổi; giữ bản cũ theo cơ chế lưu trữ của dự án.
- Tài liệu bị thay thế phải được nhận diện là Obsolete/Superseded nếu hệ thống dự án có áp dụng trạng thái này.

7. QUY TRÌNH QUẢN LÝ TÀI LIỆU

Bước	Thực hiện
Bước 1 – Tiếp nhận	Nhận file từ thiết kế, chủ đầu tư, nhà thầu, nhà cung cấp hoặc nội bộ.
Bước 2 – Phân loại	Xác định tài liệu thuộc LEG/DES/PPD/PMC/ENS/QUD/OMM/COM/Form/Other/Hồ sơ mở rộng.
Bước 3 – Kiểm tra tên	Kiểm tra ngày, mã dự án, mã tài liệu, tên và phiên bản.
Bước 4 – Kiểm tra nội dung	Xác định đúng hồ sơ, đúng phiên bản và tình trạng phê duyệt/phát hành.
Bước 5 – Lưu trữ	Đưa file vào đúng thư mục chính thức; không lưu nhầm vào thư mục tạm.
Bước 6 – Cập nhật Excel	Bổ sung/cập nhật dòng tương ứng trong "Danh sách tài liệu" và kiểm tra liên kết.
Bước 7 – Kiểm soát	Định kỳ rà soát file trùng, file sai vị trí, tên sai quy tắc, phiên bản cũ và thư mục Other.
Bước 8 – Phát hành/tra cứu	Khi chia sẻ, sử dụng liên kết từ danh mục hoặc đường dẫn chính thức; tránh gửi nhiều bản rời rạc không kiểm soát.

8. QUẢN LÝ FILE EXCEL "QUAN_LY_TAI_LIEU_DU_AN"

File Excel hiện gồm hai sheet chính: "Dashboard" và "Danh sách tài liệu". Dashboard dùng để

tổng hợp tình trạng kho tài liệu; Danh sách tài liệu dùng để tra cứu từng file/thư mục.

Sheet	Chức năng	Cách sử dụng
Dashboard	Tổng hợp số thư mục, số tài liệu, dung lượng, ảnh/video và phân tích theo thư mục/định dạng	Dùng cho báo cáo và kiểm soát tổng thể
Danh sách tài liệu	Danh mục chi tiết từng tài liệu/thư mục gộp	Tìm file, kiểm tra vị trí, ngày cập nhật và mở liên kết

Các trường dữ liệu hiện có trong "Danh sách tài liệu": STT, Tên tài liệu/Thư mục gộp, Định dạng, Dung lượng (MB), Thư mục lưu trữ, Ngày cập nhật, Người tạo, Người chỉnh sửa lần cuối, Liên kết và Ghi chú.

Cột "Liên kết" là trường truy xuất trực tiếp. Khi di chuyển/đổi tên thư mục hoặc file, phải kiểm tra lại các hyperlink để tránh liên kết hỏng.

Cách tạo/ cập nhật file QUAN_LY_TAI_LIEU_DU_AN: Copy file "generate_project_registry.exe" và cùng forder với thư mục cấp 1 >> click để chạy >> chương trình sẽ tự quét toàn bộ file dự án và hệ thống thành file QUAN_LY_TAI_LIEU_DU_AN.xlsx

9. DASHBOARD – CHỈ SỐ THEO DÕI

Tại thời điểm file Excel được lập/cập nhật, Dashboard ghi nhận:

Chỉ số	Giá trị trong file Excel
Tổng số thư mục	974
Tài liệu quản lý	3.999
Dung lượng lưu trữ	22.346,74 MB
Ảnh & video đã gộp	1.586

Phân bố theo thư mục cấp 1 trong file Excel:

Nhóm	Số lượng file	Dung lượng (MB)
00. Chung (Root)	Hồ sơ chung/gốc; tài liệu điều hành chưa phân loại	
01. Project Legal (LEG)	Hồ sơ pháp lý và hợp đồng dự án	
02. Design (DES)	Thiết kế, bản vẽ, thuyết minh, PVsyst và hồ sơ liên quan	
03. Project Plan Documents (PPD)	Tiến độ, biện pháp, trình duyệt vật tư, ITP, BOM, hồ sơ kế hoạch	
04. Project Management Controls (PMC)	Quản lý dự án, báo cáo, họp, tiến độ, thay đổi, rủi ro, hình ảnh	
05. Environmental & Social (ENS)	Nhân sự, đào tạo, toolbox, kiểm tra, môi trường	
06. Quality Documents (QUD)	Hồ sơ chất lượng vật tư và công việc	
07. Operation & Maintenance (OMM)	Hồ sơ vận hành và bảo trì	
08. Commissioning (COM)	Pre-commissioning, commissioning, hồ sơ hoàn công/mẫu liên quan	

09. Handover & Close-out (HCO)	Hồ sơ hoàn thành dự án, nghiệm thu bàn giao, hoàn công, As-built, O&M bàn giao, punch list, hồ sơ đóng dự án	
10. Form (FRM)	Biểu mẫu chuẩn dùng để lập hồ sơ; quản lý template, không chứa hồ sơ đã hoàn thành	
11. Project Working & Temporary (PWT)	Hồ sơ làm việc/tạm thời: file draft, working, incoming/outgoing working copies, dữ liệu trung gian; không phải kho lưu trữ hồ sơ chính thức	

Lưu ý: các số liệu trên là ảnh chụp tại thời điểm của file Excel mẫu, không phải chỉ tiêu cố định cho mọi dự án.

10. QUY TẮC XỬ LÝ CÁC NHÓM ĐẶC BIỆT

Nhóm	Quy định
09. Handover & Close-out	Chỉ chứa hồ sơ hoàn thành/bàn giao/đóng dự án: As-built, handover dossier, O&M handover, punch list close-out, final acceptance, warranty handover và các hồ sơ close-out.
10. Form	Chỉ chứa biểu mẫu/template chuẩn. Khi biểu mẫu đã được điền và trở thành hồ sơ chính thức, phải chuyển/lưu vào đúng nhóm nghiệp vụ tương ứng.
11. Project Working & Temporary	Chỉ dùng trong quá trình làm việc: Draft, Working, Temporary. Không dùng để lưu hồ sơ đã phê duyệt/ban hành. Định kỳ phải rà soát và xóa/chuyển hồ sơ.

11. KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG DỮ LIỆU HÀNG TUẦN

1. Kiểm tra file nằm ngoài cấu trúc thư mục chuẩn.
2. Kiểm tra tên file không theo quy tắc.
3. Kiểm tra tài liệu có mã thư mục không phù hợp với nơi lưu.
4. Kiểm tra file trùng tên hoặc nhiều bản sao.
5. Kiểm tra phiên bản thấp hơn đang được sử dụng tại thư mục làm việc.
6. Kiểm tra liên kết Excel bị lỗi.
7. Rà soát "09. Other" và "11. Hồ sơ mở rộng".
8. Kiểm tra các file tạm, file tải về, file backup hoặc file hệ thống không cần thiết.
9. Đối chiếu tổng số file/dung lượng giữa thư mục thực tế và Dashboard.
10. Đối với hồ sơ nghiệm thu/hoàn công, kiểm tra đủ bản được phê duyệt trước khi chuyển sang trạng thái chính thức.

12. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM

Vai trò	Trách nhiệm chính
Chỉ huy trưởng / Project Manager	Phê duyệt nguyên tắc quản lý, phân công và kiểm soát việc tuân thủ.
Document Controller / Người quản lý hồ sơ	Duy trì cấu trúc thư mục, danh mục Excel, mã hồ sơ, phiên bản và liên kết.

Kỹ sư thiết kế	Lưu và phát hành đúng bản vẽ, thuyết minh, tính toán, PVsyst và revision.
QA/QC	Kiểm soát hồ sơ chất lượng, nghiệm thu, ITP, vật tư và bản hoàn công liên quan.
HSE	Kiểm soát hồ sơ nhân sự, đào tạo, toolbox, PTW, kiểm tra và môi trường theo phạm vi.
Site/Construction Team	Đưa hồ sơ hiện trường vào đúng thư mục, không tự tạo cấu trúc mới ngoài quy định.
O&M	Tiếp nhận và duy trì hồ sơ O&M, thiết bị, bảo trì và dữ liệu phục vụ vận hành.

13. VÍ DỤ THỰC TẾ

Loại hồ sơ	Đường dẫn	Tên file đề xuất
Biện pháp thi công	03. Project Plan Documents (PPD) / 02. Method Statement (PPD.MST)	20260929_FMS-RVA270_PPD.MST_BPTCLapDatTamPin_v2_Final.pdf
Bản vẽ thi công	02. Design (DES) / 03 Shop Drawing (DES.DWG)	20260929_FMS-RVA270_DES.DWG_ShopDrawing_SS4_v3_Final.pdf
Trình duyệt vật tư	03. Project Plan Documents (PPD) / 03. Material Approval (PPD.MAP)	20260929_FMS-RVA270_PPD.MAP_PVModule_v2_Approved.pdf
Báo cáo tuần	04. Project Management Controls (PMC) / 08. Reports (PMC.REP)	20260929_FMS-RVA270_PMC.REP_BaoCaoTuan39_v1.pdf
Hồ sơ chất lượng vật tư	06. Quality Documents (QUD) / 01. Materials (QUD.MAT)	20260929_FMS-RVA270_QUD.MAT_BienBanNghiemThuPVModule_v1.pdf
Commissioning	08. Commissioning (COM) / 02 Commissioning (COM.COM)	20260929_FMS-RVA270_COM.COM_BienBanCommissioning_Inverter01_v1.pdf

14. QUY TRÌNH KHI TẠO MỘT HỒ SƠ MỚI

Người tạo hồ sơ có thể sử dụng chuỗi kiểm tra nhanh sau:

☐ Tôi biết hồ sơ thuộc nhóm cấp 1 nào chưa?
☐ Tôi đã xác định mã tài liệu/thư mục chưa?
☐ Tên file đã có ngày – mã dự án – mã tài liệu – tên – phiên bản chưa?
☐ File có phải bản chính thức hay chỉ là bản làm việc?
☐ File đã được lưu vào đúng thư mục chưa?
☐ Danh sách Excel đã được cập nhật chưa?
☐ Hyperlink có mở đúng file/thư mục không?
☐ Nếu là bản sửa đổi, phiên bản cũ đã được xử lý đúng chưa?

15. SƠ ĐỒ LUỒNG QUẢN LÝ

TIẾP NHẬN HỒ SƠ

↓

PHÂN LOẠI NHÓM TÀI LIỆU

↓

XÁC ĐỊNH MÃ THƯ MỤC

↓

ĐẶT TÊN FILE + PHIÊN BẢN

↓

KIỂM TRA NỘI DUNG / TRẠNG THÁI

↓

LƯU VÀO THƯ MỤC CHÍNH THỨC

↓

CẬP NHẬT EXCEL – DASHBOARD

↓

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ

↓

PHÁT HÀNH / TRA CỨU / BÀN GIAO
